Enterprise Uzbekistan

REGULATORY SANDBOX


Международный опыт и модель запуска песочницы МЦЦТ

Интерактивная версия стратегического отчета: разделы, кейсы и этапы открываются по щелчку

Открыть навигатор ›

Ссылки активны в режиме показа слайдов

Материалы к заседанию Управляющего совета · Октябрь 2026

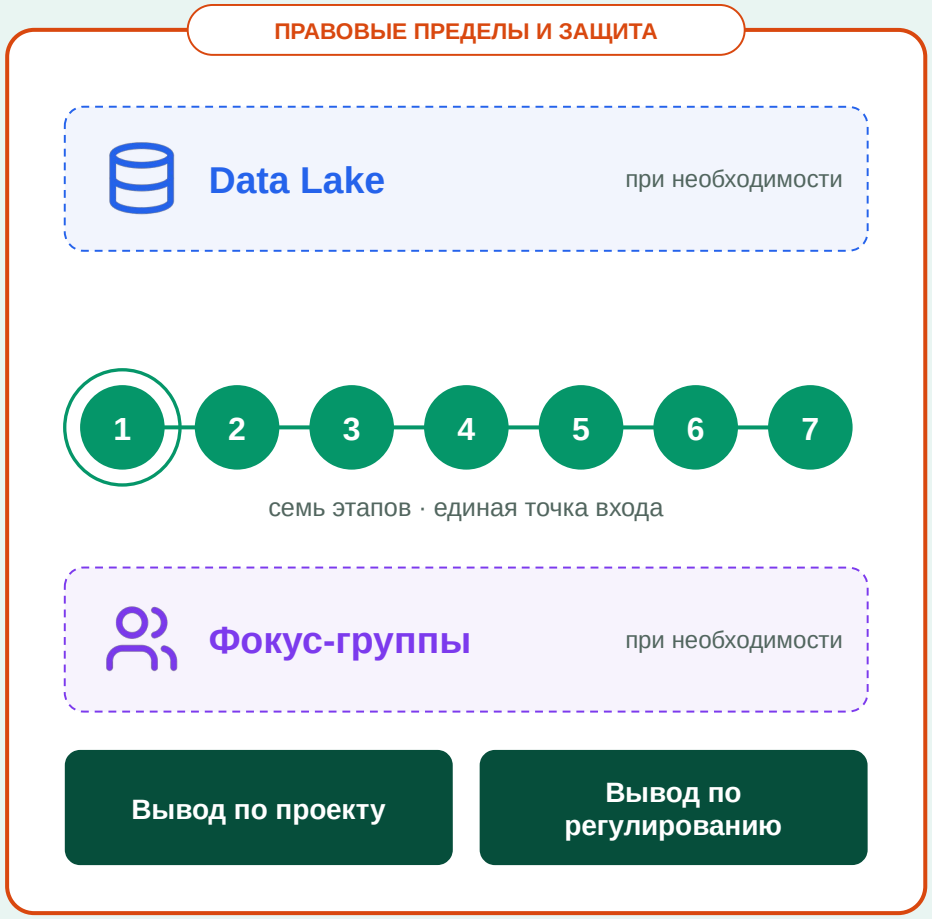

Нажмите на элемент схемы, чтобы перейти к разделу

Навигатор по презентации

Нажмите на раздел. Вкладки вверху каждого слайда ведут к разделам, «Меню» возвращает сюда

01

Главное

Пять выводов, десять рекомендаций и решения Совета

Слайды 3–5 ›

02

Мир в цифрах

Результаты песочниц, избирательность и неудачи

Слайды 6–8 ›

03

Кейсы

Восемь программ: что измеряли и что берет МЦЦТ

Слайды 9–17 ›

04

Модель МЦЦТ

Экосистема, форматы, правовая основа, кто решает

Слайды 18–22 ›

05

Этапы и механизмы

Путь заявки, семь этапов, Data Lake, фокус-группы

Слайды 23–26 ›

06

Защита и границы

Критерии допуска, пределы теста, риски, выход

Слайды 27–29 ›

07

Пилоты и партнеры

Портфель P1–P4 и роль WEF

Слайды 30–31 ›

08

План и решения

90 дней, 12 месяцев, KPI, матрица решений

Слайды 32–35 ›

Статус данных, источники и расхождения с моделью МЦЦТ ›

Главное: пять выводов из международного опыта

Результаты песочниц реальны, но скромны — это обосновывает компактный запуск песочницы МЦЦТ

ВЫВОД 1

15 из 19

MAS: вышли с лицензией (R)

Лицензия по итогам теста — самый частый результат, но считают его по-разному

MAS: 15 из 19 (на конец сент. 2025, R); SAMA: 18 из 45 (май 2023, R); DFSA: 3 из 51 (срез июня 2021, R)

ДЛЯ МЦЦТ

Варианты выхода — при допуске

ВЫВОД 2

+15%

капитал после допуска (I)

Коммерческий эффект независимо подтвержден лишь по одной программе

BIS: допуск в песочницу FCA — около +15% к привлеченному капиталу и +50% к вероятности привлечения (2014–2019, I)

ДЛЯ МЦЦТ

Строгий отбор и учет итогов с первого допуска

ВЫВОД 3

22 из 30

Ofgem: лишь обратная связь (R)

Большинству заявителей нужны разъяснения, а не освобождения

Ofgem, окно 1: 22 из 30 — только обратная связь, открыто 3 песочницы (R). ICO публикует отчеты о выходе, не имея права освобождать

ДЛЯ МЦЦТ

Трек разъяснений — с Дня запуска

ВЫВОД 4

0

одобрений Sandbox Plus (R)

У ускоренных и грантовых треков нет подтвержденного успеха

MAS Sandbox Plus: ни одного одобрения (на конец сент. 2025, R). Sandbox Express: цель 21 день, данных о соблюдении нет (T)

ДЛЯ МЦЦТ

Без грантов; Экспресс-трек — после когорты 1

ВЫВОД 5

0 из 8

GFIN: начали тест (R)

Трансграничные и межрегуляторные тесты трудно запустить

GFIN: 44 заявки к 17 регуляторам, отобрано 8 — ни одна не начала тест (янв. 2020, R). TradeTech: итоги — по данным организатора (P)

ДЛЯ МЦЦТ

Трансграничный трек — во 2-й год

Источники: [S2] BIS; [S6] Ofgem; [S7] MAS; [S8] MAS Express; [S14] DFSA; [S15] GFIN; [S22] SAMA. Цифры не сверены с первоисточниками.

Десять рекомендаций ›

Что предлагаем: десять рекомендаций

Компактный старт: разъяснения с Дня запуска, тесты с 6-го месяца, расширение — только по данным

1 Два трека на старте
Трек разъяснений — в День запуска; полноформатная песочница — после Правил (3–4 пилота)
День 90 · М4 · М6

2 Секретариат и Комитет по песочнице
Комитет решает по делегированию Совета; Секретариат — около 6 человек (плановое допущение)
Дни 30–60

3 Опубликованные сроки решений
Нормативные сроки с приостановкой отсчета; ежеквартальный отчет об их соблюдении
Запуск · отчет М6

4 Регуляторное картирование
По каждому делу — все применимые нормы и согласия; МЦЦТ не освобождает от требований других органов
С М4

5 Доказательства для выхода — при допуске
Раздел о выходе в каждом плане тестирования; автоматической лицензии нет
С М6

6 Минимальная цифровая песочница
Прием заявок — с запуска; тестовая среда на синтетических данных и API — в М6
Запуск · М6

7 Портфель пилотов Р1–Р4
Три пилота в песочнице и один внутренний; у каждого — ответственный и орган согласия
День 75

8 Новые треки — поэтапно
Экспресс-трек и прототипирование — после оценки когорты 1; трансграничный — во 2-й год
≈ М13–М14

9 WEF — организатор диалога
Экспертная рецензия Правил; решения, правила, риски и данные остаются за МЦЦТ
День 75

10 Правовой спринт по текстам актов
До разработки правил подтвердить правовую основу и полномочия по официальным текстам
Дни 20–25

Решения Управляющего совета

Что нужно на этом заседании и что вносится позднее — по графику от Дня 0 (принятие отчета Советом)

НА ЭТОМ ЗАСЕДАНИИ

D1 · D2	Одобрить в принципе операционную модель, очередность треков и полномочия по допуску
D3	Утвердить штатную численность; поручить подготовку сметы к Дню 45
D4a	Поручить правовую верификацию по официальным текстам — к Дню 20
D6	Поддержать критерии отбора пилотов P1–P3 и внутреннего пилота P4
D8	Поручить проработку сотрудничества с WEF и альтернатив
D11	Установить условие выпуска английской редакции отчета

ДАЛЕЕ ПО ГРАФИКУ

Дни 20–25	Правовая основа и заключение о полномочиях (D4a)
День 30	Постановления по D1 и D2 — после заключения по D4a
День 45	Смета расходов (D3)
День 60	D5 меры защиты · D9 публикация · D12 согласие регуляторов · положение о Комитете
День 75	Проект Правил (D4b) · портфель пилотов (D6) · условия с WEF (D8)
M4	Окончательные Правила песочницы (D4b)

При принятии отчета в конце октября 2026 г. День запуска — около 21 января 2027 г.: это дата вступления ЗРУ-1169 в силу по данным одного издания (подлежит сверке).

Глава 1 и раздел 8.5 отчета (Иллюстрация 25).

Матрица D1–D12 ›

Мир в цифрах: результаты реальны, но скромны

Наиболее весомые задокументированные результаты и ключевые пробелы — по опубликованным данным

15 из 19 R

компаний, принятых MAS, вышли из песочницы с лицензией

Сингапур, на конец сент. 2025; охват по трекам неясен

+15% | +50% I

капитал и вероятность его привлечения после допуска в песочницу FCA

Великобритания, 2014–2019; одно рецензируемое исследование

172 из 629 R

заявок принято в песочницу FCA (27%, D)

Великобритания, 2016 — дек. 2023

≈ 3 мес. R

медианный срок MAS от заявки до решения, включая время заявителя

Сингапур, данные опубликованы в окт. 2025

0 R

одобренных заявок в Sandbox Plus — грантовом треке с янв. 2022

Сингапур, на конец сент. 2025

0 из 8 R

отобранных GFIN компаний начали трансграничный тест

17 регуляторов; отчет по пилоту, янв. 2020

22 из 30 R

заявок в окне 1 Ofgem получили только обратную связь

Конкретный барьер не выявлен; по 3 заявкам открыты песочницы (сент. 2018)

0 из 14


программ публикуют аудированные данные об экономии времени или затрат

Пробел в доказательной базе по рассмотренным источникам

Иллюстрация 1 отчета. R — данные регулятора; I — независимая оценка; D — расчет. Источники: [S2] [S3] [S6] [S7] [S15].

Избирательность: допускают от 10% до 50% заявок

Расчет по опубликованным данным (D); определения и периоды различаются — это диапазон, а не рейтинг

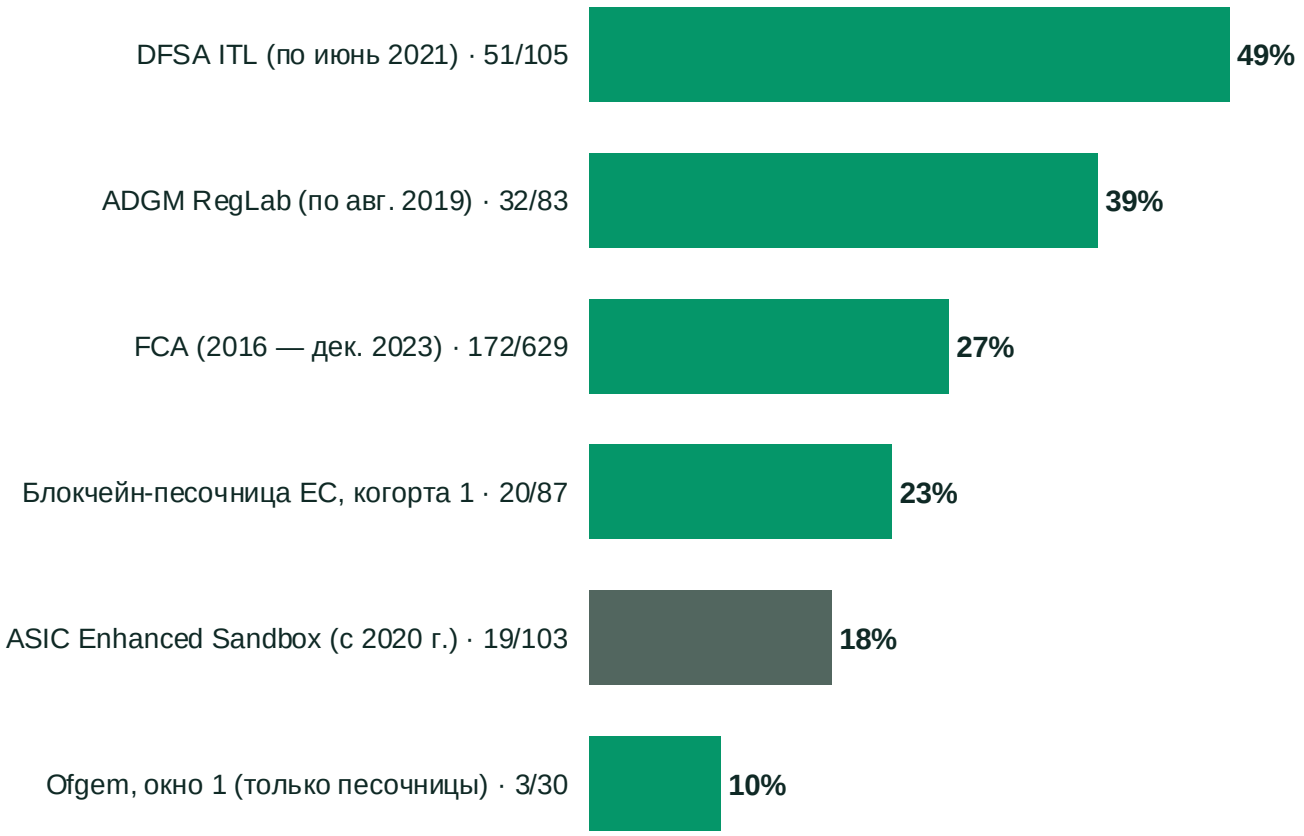

ЧТО ПОКАЗЫВАЮТ ДАННЫЕ

1. **Допуск — это сигнал.** Британские данные говорят об эффекте для финансирования; когорта без строгого отбора подорвала бы этот сигнал.

2. **Пропускная способность невелика.** Там, где отслеживается выход (MAS, DFSA, Япония), реальные тесты проходит немного компаний; первая когорта МЦЦТ — 3–4 пилота.

3. **Спрос нужно проверить.** Сокращение числа заявок (Корея, песочница ИКТ: со 110 до 67 за два года, S) указывает и на слабый спрос.

4. **Разъяснения не требуют освобождений.** Ofgem, ICO, блокчейн-песочница ЕС и Испания выпускали разъяснения без освобождений от закона.

Иллюстрация 2 отчета: [S3] FCA; [S6] Ofgem; [S14] DFSA; [S17] EC; [S24] ASIC (S, дата среза неизвестна); [S49] ADGM. Зеленый — R, серый — S.

Неудачи задокументированы: шесть уроков для МЦЦТ

Факты — по опубликованным данным; причины неудач и ответные меры — интерпретация аналитика (A)

НЕУДАЧА	ДАННЫЕ	ОТВЕТНАЯ МЕРА МЦЦТ
Стимулирующий трек не востребован	MAS Sandbox Plus: одобрений нет (на конец сент. 2025); по заявлению MAS, большинство заявок — технологии, уже применяемые в Сингапуре (R)	**Без грантов и стимулирующего трека, пока проверка спроса не покажет потребность**
Трансграничный пилот не дошел до теста	GFIN: ни одна из 8 отобранных компаний не начала тест (янв. 2020, R); последующие когорты не подтверждены	**Трансграничный трек — во 2-й год; единый план тестирования и один ведущий орган**
Медленный переход на постоянный режим	DFSA: 3 из 51 принятой компании вышли; на июнь 2021 г. 5 еще тестировались, 7 имели предварительное одобрение (R; S)	**Доказательства для выхода — в каждом плане тестирования при допуске**
Выход без лицензии	ASIC (Австралия): 1 лицензия на 16 выходов, 12 компаний закрылись (S, изложение обзора в прессе)	**Консультации с лицензирующим органом при проектировании теста; варианты выхода — при допуске**
Сокращение числа заявок	Корея, песочница ИКТ-конвергенции: со 110 до 67 заявок за два года (S, сообщение прессы, авг. 2026)	**Проверка спроса до запуска; на старте — два трека**
Целевой срок без данных о соблюдении	MAS Sandbox Express: целевой срок 21 день; данных о соблюдении не найдено (T)	**Ежеквартальная публикация соблюдения сроков (KPI 1–3)**

Иллюстрация 3а отчета: [S7] MAS; [S8] MAS Express; [S14] DFSA; [S15] GFIN; [S23] Корея; [S24] ASIC.

Восемь кейсов: что измеряли и что берет МЦЦТ

Нажмите на карточку, чтобы открыть кейс; на каждом слайде кейса есть кнопка возврата к карте

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ›

Песочница FCA

+15% капитала

после допуска (I)

Учет итогов с первого допуска

СИНГАПУР ›

MAS: Sandbox, Express, Plus

15 из 19

вышли с лицензией (R)

Без грантов; Экспресс — после когорты 1

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ›

FCA Digital Sandbox

84% (P)

пилот ускорил разработку

Тестовая среда и синтетические данные — M6

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ ›

Песочница ICO

10 из 64

отобрано на бета-этап (R)

Публичная библиотека позиций

ОАЭ ›

ADGM RegLab и DFSA ITL

3 из 51

вышли из песочницы DFSA (R)

Доказательства для выхода — при допуске

ОАЭ ›

TradeTech (WEF и ОАЭ)

8 стартапов

по данным организатора (P)

Один ведущий орган на тест

ГОНКОНГ ›

HKMA GenAI Sandbox

15 → 36

сценариев ИИ за два года (R)

Одна тематическая когорта ИИ и данных

ЕС ›

Песочницы ЕС

60

сценариев в трех когортах (R)

Отчет о выводах по каждой когорте

Также в обзоре: Ofgem, SAMA, ASIC, Япония, Корея, GFIN — см. «Неудачи и ответные меры» ›

FCA (Великобритания): допуск — сигнал для инвесторов

Великобритания · Управление по финансовому регулированию и надзору · запуск 2016 · действует

+15%

к привлеченному капиталу после допуска; вероятность привлечения — +50% (BIS, данные 2014–2019, I)

ЧТО ВВЕЛИ

Тест в реальных условиях с реальными потребителями под индивидуальными ограничениями и мерами защиты. Инструменты: ограниченное разрешение, индивидуальные разъяснения, изменение только правил FCA (не национального закона), письма о неприменении мер принуждения — они не ограничивают ответственность перед потребителями. С авг. 2021 г. прием заявок постоянный; с конца 2025 г. — тематические когорты.

ОПУБЛИКОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Когорты 1–2 (по окт. 2017): 146 заявок, принято 50, тест провела 41 компания (R)
- Когорта 1: около 90% завершивших тест продолжили подготовку к запуску; не менее 40% получили инвестиции (R)
- 2016 — дек. 2023: 629 заявок, принято 172 (27%, D); в 2025 г. принято 13% заявок (R)
- Когорта по стейблкоинам: отобрано 4 из 20 заявок (февр. 2026, R)

НЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: ЦЕЛИ И ПРОБЕЛЫ

Сроки 2–3 недели (критерии) и 8–12 недель (полная оценка) — ориентиры (T); измеренных сроков нет. Отбор неслучаен — это связь, а не доказанная причина.

ВЫВОД ДЛЯ МЦЦТ

Место в песочнице ценно как знак строгой проверки. Сила сигнала МЦЦТ определяется качеством отбора и опубликованными обоснованиями решений.

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ МЦЦТ

В каждом соглашении о тестировании — отслеживание итогов (финансирование, лицензия, выживаемость): при допуске, при выходе, через 12 и 24 месяца. Первые данные — около M18. Изменений законодательства не нужно: достаточно договорного условия.

Источники: [S1] FCA, 2017; [S2] BIS WP 901; [S3] FCA FOI, май 2026; [S39]; [S40]; [S41]. Цифры не сверены с полными текстами первоисточников.

MAS (Сингапур): лицензии есть, гранты не сработали

Сингапур · Валютное управление Сингапура · три трека, 2016–2022 · действует

15 из 19

принятых компаний вышли из песочницы с лицензией; одна позднее прекратила работу (на конец сент. 2025, R)

ЧТО ВВЕЛИ

FinTech Regulatory Sandbox (2016) — для решений, новых для Сингапура. Sandbox Express (2019): заранее заданные условия для низкорисковых видов деятельности, тест до 9 месяцев, целевой ответ — 21 день. Sandbox Plus (2022): для первопроходцев — грант 50% признаваемых расходов, не более S$500 000.

ОПУБЛИКОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- С 2016 г. принято 19 компаний, 15 вышли с лицензией; охват по трекам неясен (R)
- Медианный срок рассмотрения — около 3 месяцев с учетом времени заявителя (R)
- Части заявителей отказано: действующие правила уже допускали их модели (R)
- Sandbox Plus: одобрений нет; большинство заявок — технологии, уже применяемые в Сингапуре (R)

НЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: ЦЕЛИ И ПРОБЕЛЫ

Sandbox Express: 21 день — цель (T); данных о соблюдении срока и использовании трека не найдено.

ВЫВОД ДЛЯ МЦЦТ

Заимствовать заранее определенные условия Express в узком объеме; не вводить грантовый трек без подтвержденного спроса; публиковать достигнутые результаты, а не только цели.

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ МЦЦТ

По данным мониторинга когорты 1 (M9–M12) подготовить две низкорисковые категории со стандартными условиями; пилот Экспресс-трека — примерно с M13–M14. Решение — в течение 21 календарного дня после полной заявки (плановое допущение), ежеквартальный отчет о соблюдении.

Источники: [S7] MAS, ответ парламенту 14.10.2025; [S8] Sandbox Express; [S9] Sandbox Plus. Цифры не сверены с полными текстами первоисточников.

FCA Digital Sandbox: данные ускоряют разработку

Великобритания · FCA · пилоты 2020–2022; постоянно с авг. 2023; программы по ИИ с 2025 · действует

84%

респондентов пилота 1: пилот ускорил разработку; лишь около половины — данные оправдали ожидания (P, по данным FCA)

ЧТО ВВЕЛИ

Облачная тестовая среда: синтетические наборы данных, API и модуль наблюдения. Без реальных потребителей и без послаблений в разрешениях — по сути, техническое тестирование в терминах модели МЦЦТ.

ОПУБЛИКОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- DataSprint (2020): около 120 участников за три недели готовили синтетические данные (R)
- Пилот 1: 28 организаций из 94 заявок; пилот 2: 12 компаний из 40 (R)
- Постоянная работа с 1 авг. 2023 г.; оператор — NayaOne; в каталоге более 300 наборов данных (авг. 2026, R)
- Программы ИИ (данные о приеме): Supercharged Sandbox — 23 из 132, затем 21 из 199; AI Live Testing — когорты из 7 и 8 компаний (R)

НЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: ЦЕЛИ И ПРОБЕЛЫ

Оценка AI Live Testing ожидается в 1-м кв. 2027 г. (T); по программам ИИ есть только данные о приеме.

ВЫВОД ДЛЯ МЦЦТ

Синтетические данные и защищенная тестовая среда — базовая услуга с первых допусков; спецификацию качества данных согласовать с участниками.

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ МЦЦТ

M2–M6: минимальная тестовая среда; запуск в M6 для первых пилотов — отдельный контур для каждого участника, синтетические данные для P1 и P3, API-шлюз, журналирование. Эксплуатацию можно поручить внешнему оператору под контролем МЦЦТ.

Data Lake ›

Источники: [S4] FCA Digital Sandbox; [S42]; [S43]; [S33]; [S44]. Цифры не сверены с полными текстами первоисточников.

ICO (Великобритания): разъяснения без права освобождать

Великобритания · Управление Уполномоченного по информации (с 30.09.2026 — Комиссия, S) · с 2019 г.

10 из 64

организаций отобрано на бета-этап (июль 2019; по обзору 2021 г. — из 65, R)

ЧТО ВВЕЛИ

Песочница регулятора, который не вправе освобождать от требований закона: совместная проработка продукта с регулятором и публикация отчетов о выходе, которыми могут пользоваться и другие компании.

ОПУБЛИКОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- 9 из 10 вышли в июне 2020 — марте 2021 г., позже плана из-за COVID-19 (R)
- Отчет о выводах 2024 г.: 14 участников, принятых после бета-этапа (R)
- Опубликованы отчеты, в т. ч. Our Future Health (окт. 2023) и Meta (отчет о выходе, сент. 2025) (R)
- Участники отметили доступ к экспертизе и уверенность в продуктах (P, по данным ICO)

НЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: ЦЕЛИ И ПРОБЕЛЫ

Стоимость разъяснений не раскрывается; трудозатраты персонала значительны; выгоды — по данным участников (P).

ВЫВОД ДЛЯ МЦЦТ

Трек разъяснений не требует полномочий на освобождение и может работать до окончательных правил. Позиции по национальным нормам — совместно с компетентным регулятором или как мнение МЦЦТ без обязательной силы.

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ МЦЦТ

Каждое дело в Треке разъяснений завершается письменной позицией в течение 30 рабочих дней после полного запроса (плановое допущение); позиция публикуется в обезличенном виде. Результат — публичная библиотека позиций.

Форматы и треки ›

Источники: [S5] ICO; [S46] ICO, 2024; [47]. Цифры не сверены с полными текстами первоисточников.

ADGM и DFSA (ОАЭ): заявителей много, выходов мало

ОАЭ · FSRA ADGM (2016) и DFSA (2017) · действуют; свежих официальных итоговых данных нет

3 из 51

принятой DFSA компании успешно завершили тест (срез на июнь 2021 г., а не итоговая доля, R)

ЧТО ВВЕЛИ

RegLab ADGM: условное разрешение и набор когортами. DFSA: тестовая лицензия (Innovation Testing Licence) сроком до 12 месяцев; с 2022 г. — непрерывный прием заявок.

ОПУБЛИКОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- RegLab: допущены 32 из 83 заявок из 20 стран (май 2017 — авг. 2019, R); NOW Money и Pyypl работают на рынке
- DFSA ITL: подано 105, принято 51, вышли 3 (июнь 2021, R); подано 130, принято 67 (июль 2022, R)
- Первая вышедшая компания DFSA — Sarwa (робо-эдвайзер), 5 нояб. 2018 г., после почти 12 месяцев теста (R)

НЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: ЦЕЛИ И ПРОБЕЛЫ

Срок рассмотрения DFSA «обычно 10–12 недель» — ориентир (T); итоговая доля получивших лицензию не опубликована.

ВЫВОД ДЛЯ МЦЦТ

Регион уже привлекает заявителей. МЦЦТ должен выделиться специализацией на новых технологиях вне финансового сектора, опубликованными сроками с отчетом о соблюдении и критериями выхода с самого начала.

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ МЦЦТ

В каждом плане тестирования при допуске фиксируются доказательства для перехода на постоянный режим (лицензия, действующие правила или обновленный режим); переход отслеживается. С лицензирующим органом консультируются при проектировании теста — без обязательств для него.

После теста ›

Источники: [S13]; [S14] DFSA; [S49] ADGM; [S50]. Цифры не сверены с полными текстами первоисточников.

TradeTech (WEF и ОАЭ): межрегуляторный тест осуществим

ОАЭ · WEF и органы ОАЭ · MoU — янв. 2024, доклад WEF — окт. 2025 · итоги по данным организатора (P)

8

стартапов протестировали решения с участием регуляторов ОАЭ (доклад WEF, окт. 2025, P)

ЧТО ВВЕЛИ

Межрегуляторная песочница под эгидой организатора диалога. Темы: цифровые торговые документы, самосуверенная цифровая идентичность, платежи в стейблкоинах, кредитование в децентрализованных финансах (DeFi).

ОПУБЛИКОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- 8 стартапов; WEF упоминает четыре регулятора ОАЭ, но в доступных источниках они не названы (P)
- Около 21 месяца от меморандума (янв. 2024) до доклада WEF (окт. 2025) (D)
- Платформу предоставил поставщик — по данным поставщика (P)

НЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: ЦЕЛИ И ПРОБЕЛЫ

Итоги по каждому участнику не опубликованы; независимой оценки нет.

ВЫВОД ДЛЯ МЦЦТ

Организатор диалога снижает издержки координации в пилотах с несколькими органами — если итоги раскрываются по каждому участнику, а нерешенные вопросы публикуются.

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ МЦЦТ

Пилот P2 (электронные торговые документы с проверкой на основе ИИ) — по единому плану тестирования с одним ведущим органом. Любой партнер, включая WEF, отчитывается по каждому участнику; рецензия WEF факультативна и вне критического пути.

Пилот P2 › Роль WEF ›

Источники: [S10]; [S11] WEF, окт. 2025; [S32]. Цифры не сверены с полными текстами первоисточников.

HKMA GenAI Sandbox: с 15 до 36 сценариев за два года

Гонконг (CAP) · HKMA совместно с Cyberport · запуск 2024 · действует

15 → 36

сценариев использования: когорта 1 (дек. 2024) → Sandbox++ (авг. 2026; охват шире, R)

ЧТО ВВЕЛИ

Когорты проектов генеративного ИИ: банки работают в паре с технологическими партнерами. В Sandbox++ охват расширен на компании рынка ценных бумаг и страховщиков, поэтому когорты напрямую не сопоставимы.

ОПУБЛИКОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Когорта 1 (дек. 2024): 15 сценариев, 10 банков, 4 техпартнера; более 40 предложений (R)
- Когорта 2 (окт. 2025): 27 сценариев, 20 банков, 14 техпартнеров; более 60 предложений (R)
- Sandbox++ (авг. 2026): 36 сценариев, 30 организаций, 27 техпартнеров; около 100 предложений (R)
- Надзорная песочница FSS: около 234 инициатив к концу 2021 г. — это тесты, а не компании (R)

НЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: ЦЕЛИ И ПРОБЕЛЫ

Данных об итогах тестов не найдено; независимой оценки песочниц для ИИ пока нет.

ВЫВОД ДЛЯ МЦЦТ

Начать с одной тематической когорты и расширяться следующими раундами по итогам анализа; рассмотреть пары участников с технологическими партнерами.

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ МЦЦТ

Первый раунд полноформатной песочницы — единый набор пилотов ИИ и данных (не более 3–4): объявление — не позднее Дня 90, открытие — с принятием Правил (M4), первые допуски — M6. Решение о раунде 2 — на обзоре в M9.

Пилоты ›

Источники: [S21] HKMA. Цифры не сверены с полными текстами первоисточников.

Песочницы ЕС: разъяснения вместо освобождений

ЕС · блокчейн-песочница (2023–2026) · песочницы ИИ по Закону ЕС об ИИ (ст. 57–59) · пилот Испании

60

сценариев использования в трех когортах блокчейн-песочницы; более 50 регуляторов и органов власти в когорте 1 (R)

ЧТО ВВЕЛИ

Необязывающий трансграничный диалог регуляторов и компаний без освобождений от требований. Итог — публикуемые отчеты о лучших практиках и руководства, пригодные для повторного использования.

ОПУБЛИКОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- Блокчейн-песочница, когорта 1: 87 заявок, отобрано 20 сценариев (R)
- Итоговый отчет о лучших практиках (11 февр. 2026): 60 сценариев в трех когортах (R)
- Испания: 11 систем ИИ завершили пилот; руководства по Закону ЕС об ИИ и отчет об итогах (сент. 2026, R)

НЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: ЦЕЛИ И ПРОБЕЛЫ

Количественных оценок эффекта песочниц от органов ЕС, МВФ или Всемирного банка за 2023–2026 гг. не найдено.

ВЫВОД ДЛЯ МЦЦТ

Отчет о лучших практиках по каждой когорте превращает диалог в разъяснения для всех и укрепляет авторитет организатора как нормотворца в сфере новых технологий.

ПРОЕКТНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ МЦЦТ

Отчет о регуляторных выводах — в течение 60 календарных дней после завершения каждой когорты (для когорты 1 — около M14); утверждает Совет; выводы используются в Треке прототипирования регулирования.

После теста ›

Источники: [S17] Европейская блокчейн-песочница; [S19] Испания; [S51]–[S54]. Цифры не сверены с полными текстами первоисточников.

Единая экосистема: семь этапов и нормативные сроки

Модель МЦЦТ, дополненная выводами отчета: у каждого этапа есть ответственный, решение и срок

ЭТАПЫ

Data Lake
при необходимости

Семь этапов
основной маршрут

Фокус-группы
при необходимости

Защита
весь цикл

ПРАВОВЫЕ ПРЕДЕЛЫ И ЗАЩИТА: НА ВСЕМ ЖИЗНЕННОМ ЦИКЛЕ

1	2	3	4	5	6	7
Обращение	Правовая и проектная оценка	Выбор формата	План и готовность	Тестирование	Оценка результата	Выход и исполнение
5 р. д.	25 р. д.	25 р. д. (этапы 3–4)		до 12 мес.	30 р. д.	20 р. д.

запрос данных

законность и доступность

? — если подключен: условия доступа → работа в рамках плана → качество данных → закрытие доступа

нужны ли участники

возможность и риски

? — если подключены: отбор и договоры → контролируемый тест → обратная связь → обязательства

Лимиты и сроки | **Мониторинг и инциденты** | **Основания остановки** | **Защита пользователей** | **Ответственность за вред**

Реальные операции — только после этапа 4 и при выполнении правовых условий

Вывод по проекту

дальнейший режим: внедрение, продолжение, расширение или закрытие

Вывод по регулированию

правила достаточны или требуются изменения

Решения о дальнейшем режиме и об изменении норм принимают компетентные органы

Срок до решения о допуске — 50 р. д. (этапы 2–4, плановое допущение); отсчет приостанавливается, пока МЦЦТ ждет ответа заявителя или регулятора

Форматы и треки: два на старте, остальное — по данным

Формат выбирается на этапе 3; Трек разъяснений работает без теста и без освобождений от требований

Разъяснение без теста

Трек разъяснений

Письменная позиция в течение 30 р. д. (плановое допущение), публикуется в обезличенном виде. По национальным нормам — совместно с регулятором или как мнение МЦЦТ без обязательной силы.

С Дня запуска (≈ М3)

Ориентир: ICO; Ofgem: 22 из 30 — только обратная связь

Техническое тестирование

Тестовая среда

Тест в защищенной среде на синтетических или обезличенных данных, без реальных пользователей и операций: отдельный контур для каждого участника, API-шлюз, журналирование.

Тестовая среда — М6

Ориентир: FCA Digital Sandbox

Регуляторный эксперимент


Трек полноформатной песочницы

Тест в реальных условиях: лимиты, меры защиты, порог остановки, при необходимости — согласие регулятора. В первой когорте — не более 3–4 пилотов.

Набор — М4, допуски — М6

Ориентир: MAS: 15 из 19 с лицензией; FCA

ПОСЛЕДУЮЩИЕ ТРЕКИ — ТОЛЬКО ПО ДАННЫМ КОГОРТЫ 1

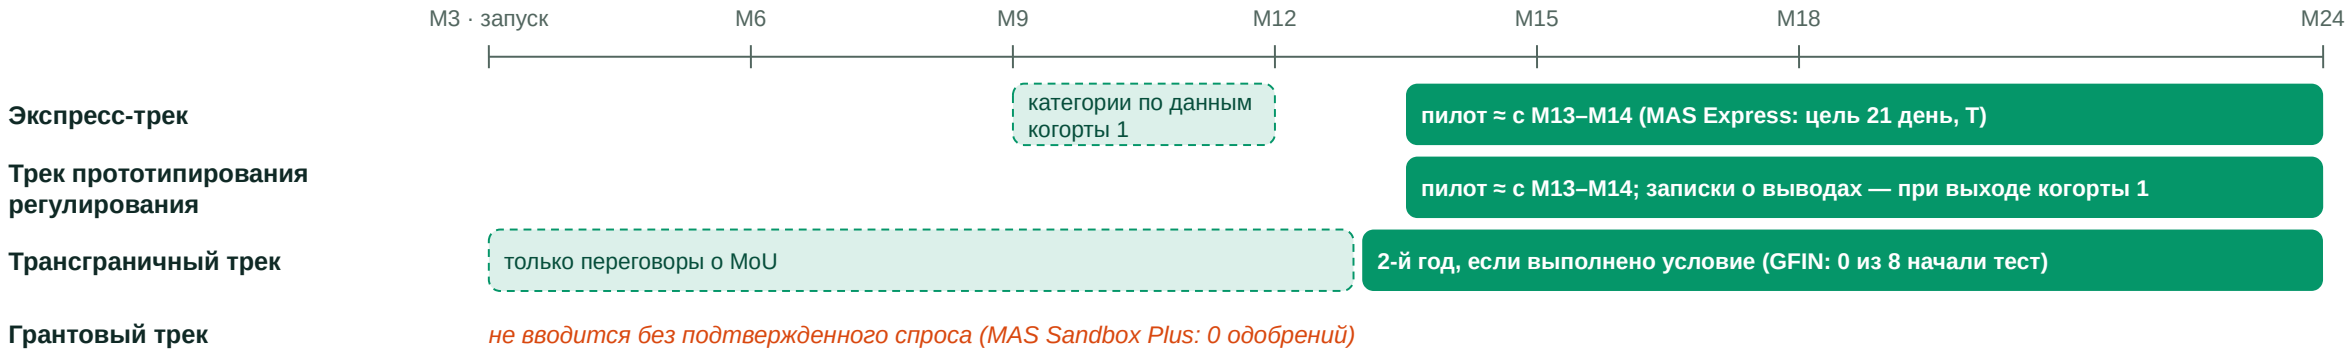

Иллюстрации 10 и 16 отчета; карточки 3.2–3.4. Сроки — плановые допущения.

Почему МЦЦТ: охват новых технологий и сроки

Лидеры уже имеют подтвержденные результаты: МЦЦТ не нужно конкурировать за поток финтех-проектов

Параметр	Сингапур (MAS)	Великобритания (FCA, ICO, Ofgem)	ОАЭ (ADGM, DFSA)	МЦЦТ (предлагается)
Сфера охвата	Финансовые услуги; три трека	Своя песочница у каждого регулятора: финансы, данные, энергетика	Финансовые услуги	**«Единое окно» для ИИ, данных, торговых технологий и цифровой идентификации (S; A)**
Результаты	15 из 19 вышли с лицензией (R)	FCA: 172 из 629 принято (R); +15% к капиталу (I)	ADGM: 32 из 83 (R); DFSA: 67 из 130 (R)	**Пока нет**
Срок рассмотрения	Медиана ≈ 3 мес. (R); Express: цель 21 день (T)	FCA: 2–3 и 8–12 недель — ориентиры (T)	DFSA: обычно 10–12 недель (T)	**50 р. д. (плановое допущение) и ежеквартальный отчет о соблюдении**
Выход	В действующее лицензирование	FCA: через ограниченное разрешение	DFSA: требования полного разрешения	**Варианты выхода — при допуске**
Пока не доказано	—	—	—	**Результаты, правовая основа, MoU о признании, спрос**

Позиционирование: конкурировать охватом новых технологий и опубликованными сроками принятия решений, а не числом финтех-проектов; не заявлять о превосходстве над давно действующими песочницами.

УСЛУГИ ПРИ ЗАПУСКЕ

- Опубликованные позиции (разъяснения)
- Предварительная проверка — 10 р. д.
- Закрепленный куратор проекта
- Условия теста и меры защиты в Правилах
- Регуляторная гибкость с М6 — только нормы в ведении МЦЦТ
- Платформа заявок; тестовая среда — М6
- Контакты с лицензирующими органами

ПОЗЖЕ — КОНКУРЕНТНОЕ ОТЛИЧИЕ

- Экспресс-решения за 21 календарный день
- Больше данных и вычислений; постоянная лаборатория
- Демо-дни и доступ к инвесторам

Иллюстрации 11 и 11а отчета: [S1] [S2] [S3] [S7] [S8] [S14] [S27] [S39] [S49] [S50]. Столбцы напрямую не сопоставимы.

Правовая основа и статус проверки

Что установлено законом, что предлагается МЦЦТ и что берем из международной практики

ЗАКОН

Конституционный закон о Центре (ЗРУ-1169), статьи 39–43*

- Песочница и экспериментальный правовой режим (W); временное освобождение от отдельных требований (S)
- Срок теста — до 12 месяцев, если Совет не установит иной (S)
- Требования к плану — ст. 41*; продолжение и расширение в Центре — решение Совета (ст. 43*)
- В силу с 21.01.2027 — по данным одного издания; до этого — указы (УП-233)

ПРЕДЛАГАЕТСЯ

Организационная модель МЦЦТ: подлежит согласованию

- Единая точка входа, семь этапов, выбор формата
- Комитет по песочнице по делегированию Совета
- Правила песочницы: проект — День 75, принятие — M4
- Data Lake, фокус-группы, взаимодействие с IT Park

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОРИЕНТИР

Подтверждают отдельные инструменты, а не модель целиком

- FCA может менять только собственные правила, но не закон
- Зарубежные лицензии, сроки и освобождения не переносятся автоматически
- В обзоре отчета: FCA, ICO, Ofgem, MAS, ADGM, DFSA, HKMA, SAMA, ASIC, EC, Япония, Корея
- AFSA — лишь в Илл. 20 и Прил. A; ЦБ Ирландии в отчете нет

* Номера статей — по рабочим материалам МЦЦТ (W); с официальным текстом закона не сверены.

ПРАВОВОЙ СПРИНТ: ПЕРВЫЕ ВОПРОСЫ ЮРИСТАМ (ДНИ 20–25)

1

Кто вводит песочницу и устанавливает объем освобождений: Совет или Администрация?

2

Может ли Совет делегировать допуск Комитету? Иначе — решения Совета в заочном порядке

3

Какие акты Совета действуют до вступления закона в силу?

4

Как разграничить режимы с ЦБ (песочница в финуслугах, до 3 лет) и NAPP?

ЕСЛИ ОСНОВА ОКАЖЕТСЯ УЖЕ

Сохраняются: Трек разъяснений (мнения без обязательной силы), Комитет (решения Совета — запасной вариант), договорные меры защиты. **Зависят от подтверждения:** освобождения, Экспресс-трек, прототипирование.

Раздел 5.6 и Приложение C отчета: [S27] Gazeta.uz; [S28] lex.uz, УП-233; [S31] рабочие материалы (W); [S57] lex.uz, ЗРУ-1169.

Кто решает: Совет, Комитет, Администрация, органы

Каждое решение принимает уполномоченный; согласие регулятора получают до допуска и никогда не презюмируют

Управляющий совет

Правила песочницы и стандартные условия; категории освобождений в пределах полномочий МЦЦТ; перечень треков; апелляции (коллегия из трех членов); по итогам теста — внедрение, продолжение и расширение в Центре (ст. 43*)

Комитет по песочнице

По делегированию Совета: допуск, условия, индивидуальные освобождения, продление, приостановление, выход. Голоса: председатель (решающий), главный юрисконсульт, два независимых эксперта; регулятор — без права голоса

Администрация МЦЦТ

Единая точка входа, оценка, сопровождение, мониторинг. Секретариат: около 6 человек во главе с руководителем песочницы (плановое допущение); закрепленный куратор проекта

Компетентные органы

Лицензии и разрешения по своей компетенции; письменное согласие на регулируемые элементы теста; нормы вне полномочий МЦЦТ. Молчание не означает согласия

ЕСЛИ РЕГУЛЯТОР ДАЕТ, НЕ ДАЕТ ИЛИ ОТЗЫВАЕТ СОГЛАСИЕ

Согласие

Условия переносятся в план дословно; Комитет может ужесточить их, но не смягчить

Отказ

В течение 5 р. д. — письмо с вариантами: изменение рамок теста, Трек разъяснений, перенаправление (ЦБ, NAPP) или закрытие дела

Нет ответа в срок MoU

Эскалация: куратор → руководитель песочницы → Исполнительный директор; дело приостанавливается или закрывается по выбору заявителя

Отзыв в ходе теста

Регулируемый элемент останавливается; применяется план свертывания; Комитет подтверждает остановку в течение 2 р. д.

Иллюстрации 7, 15 и 15а отчета. * Ст. 43 — по материалам МЦЦТ. Сроки — плановые допущения.

Путь заявки: кто ведет, что решается, какой срок

Сроки — плановые допущения (рабочие дни); отсчет приостанавливается, пока ожидается ответ заявителя или регулятора


	1 Обращение 5 р. д.	2 Правовая и проектная оценка 25 р. д.	3 Выбор формата 3–4: 25 р. д.	4 План и готовность 3–4: 25 р. д.	5 Тестирование до 12 мес.	6 Оценка результата 30 р. д.	7 Выход и исполнение 20 р. д.
Кто ведет	Компания; куратор проекта МЦЦТ	Секретариат; юрисконсульт с регуляторами	Куратор, участник, эксперт	Комитет по песочнице (согласие регулятора*)	Участник; Секретариат — ежемесячный мониторинг	Секретариат с экспертом	Комитет; Совет — правила и ст. 43; органы — лицензии
Что происходит	Онлайн-форма, контрольный перечень готовности, сведения о заявках в другие песочницы	Критерии допуска: новизна, конкретный барьер, польза, готовность, благонадежность; картирование норм и согласий	Техническое тестирование или регуляторный эксперимент; нужны ли Data Lake и фокус-группы	План: рамки, лимиты, меры защиты, KPI, доказательства для выхода, план свертывания	Тест в пределах лимитов; об инцидентах — в течение 2 р. д.	Итоговый отчет по KPI, итогам для пользователей и рискам	Вариант выхода, обязательства перед пользователями, закрытие доступа к данным
Решение	**Комплект полный? Номер дела и карточка проекта**	**К тесту или в Трек разъяснений; чье согласие нужно**	**Формат и подключаемые механизмы**	**Допуск, допуск с условиями или отказ**	**Продолжение, корректировка или остановка (председатель Комитета — немедленно)**	**Два вывода — по проекту и по регулированию; публикуются**	**Внедрение, продолжение, лицензия, изменение правил или закрытие**
Возможный выход	Доработка	Отказ, переадресация	—	Отказ (можно обжаловать)	Остановка теста	—	Закрытие проекта

Соответствие девяти этапам отчета: 1 — заявка · 2 — предварительная проверка (10 р. д.) и регуляторное картирование (15 р. д.) · 3–4 — проектирование теста (15 р. д.) и одобрение (10 р. д.*) · 5 — тестирование и мониторинг · 6 — оценка · 7 — выход

Иллюстрации 8 и 9 отчета. * Срок согласия регулятора устанавливается меморандумом. Ст. 43 — по материалам МЦЦТ.

Семь этапов: что подключается на каждом этапе

Data Lake и фокус-группы — не отдельные этапы, а механизмы, которые подключаются при необходимости

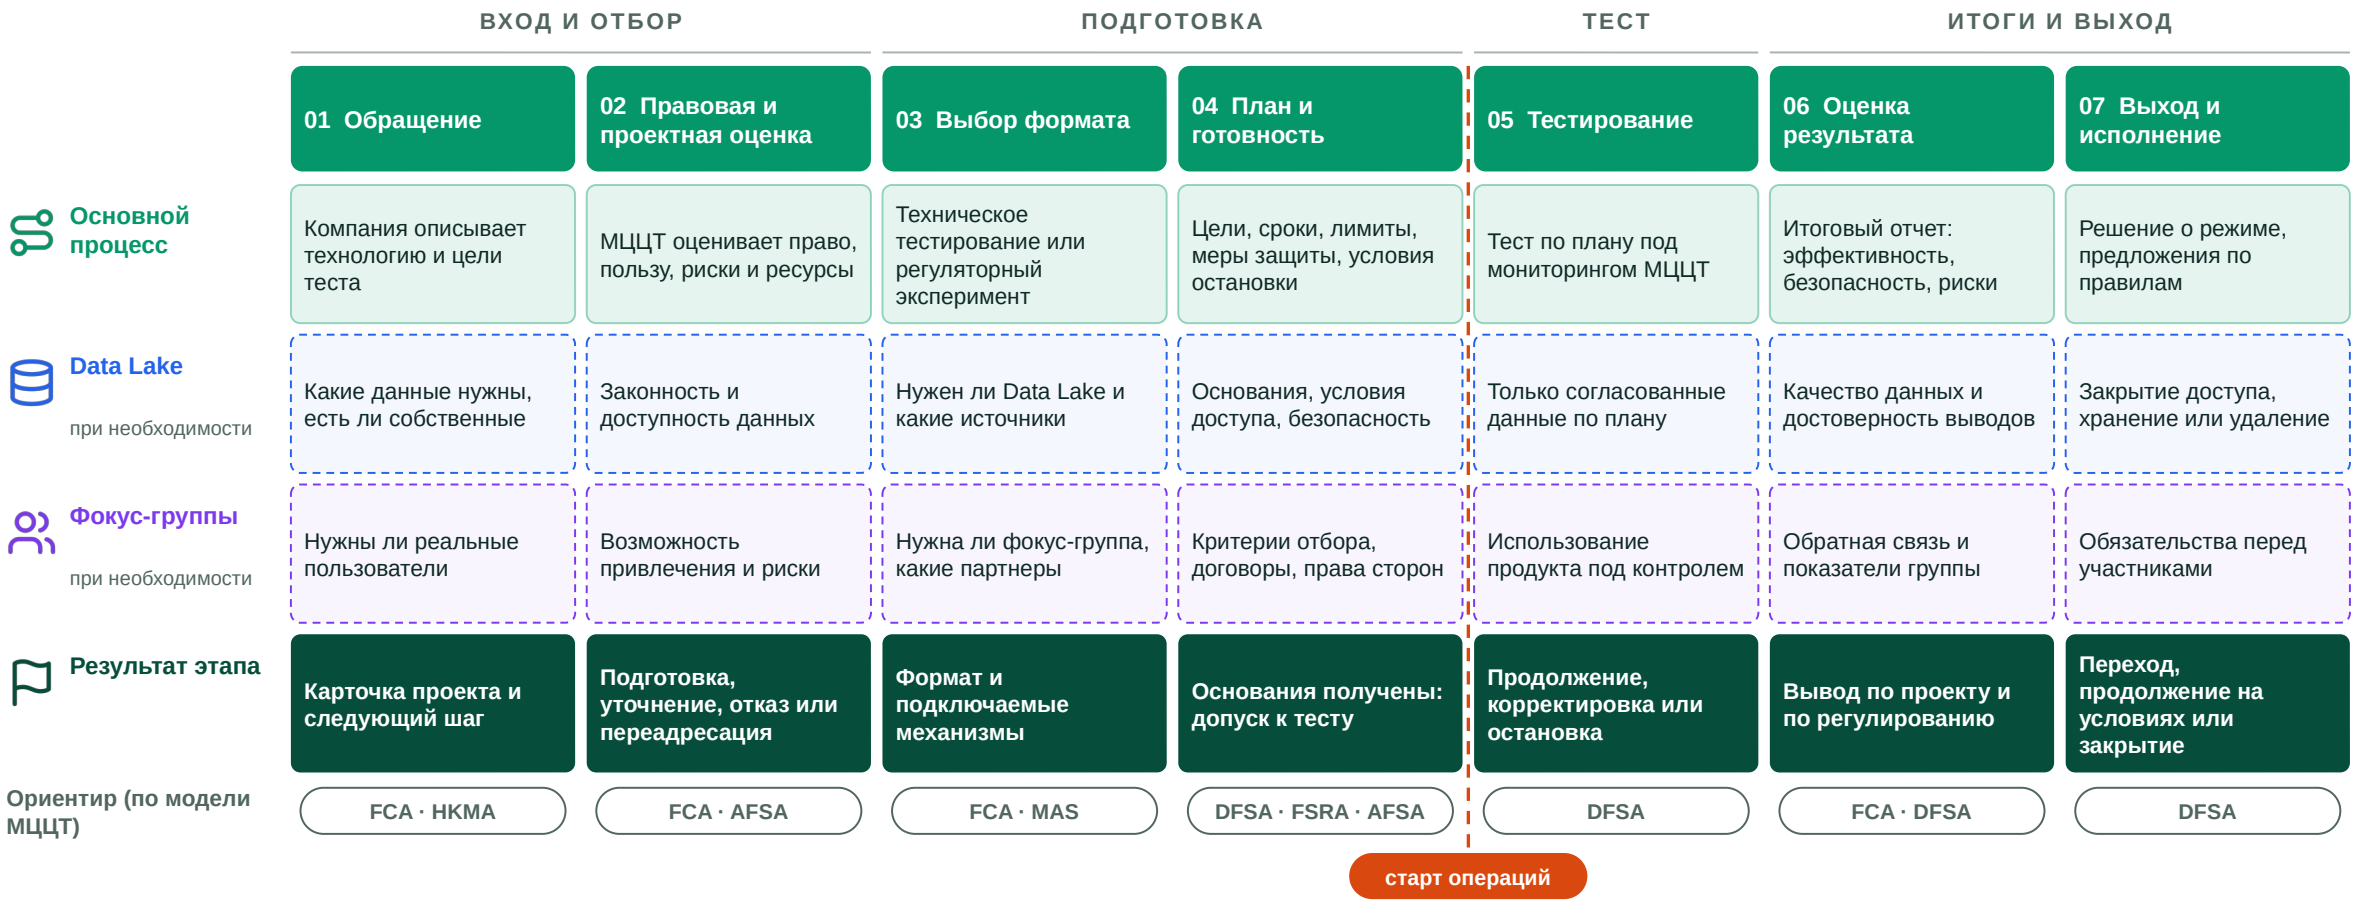

Реальные операции — только после этапа 4. Существенные изменения плана оцениваются до внедрения. Ожидание решения не продлевает право на тест.

Data Lake: данные для проверки решения

Контролируемый доступ к подходящим данным — только в пределах утвержденного плана тестирования

Компания

описывает решение и указывает, какие данные нужны для его проверки

этап 1

ИСТОЧНИКИ ДАННЫХ

Собственные данные компании

тест возможен и без Data Lake

Данные, доступ к которым организует МЦЦТ

при наличии и пригодности

Данные партнеров

IT Park и другие (предлагается)

Правовой шлюз

- правовые основания
- необходимые разрешения
- требования безопасности
- условия доступа: цель, срок, категории, ограничения

этапы 2–4

Контролируемый доступ

только для утвержденного плана тестирования

ФОРМА ДАННЫХ

обезличенные | синтетические | иные подходящие

этапы 5–6

Закрытие доступа

хранение, удаление или правомерное дальнейшее использование

этап 7

РОЛЬ МЦЦТ

Оценивает потребность в данных → Проверяет имеющиеся данные → Рассматривает данные партнеров → Определяет основания и условия доступа

ЧТО ДОБАВЛЯЕТ ОТЧЕТ

- Сначала синтетические или обезличенные данные; до реальных персональных данных эксперт проверяет оценку воздействия на защиту данных
- В плане обработки — контролер и обработчик каждого набора (участник, платформа МЦЦТ, оператор)
- Удаление или возврат данных — в течение 30 р. д. после выхода, с актом (плановое допущение)

FCA DIGITAL SANDBOX

84% — пилот ускорил разработку; лишь около половины — данные оправдали ожидания (P). Каталог — более 300 наборов (R)

ПИЛОТ P3

Обмен данными с сохранением конфиденциальности: независимый тест на повторную идентификацию до допуска реальных данных

Фокус-группы: реальные пользователи под защитой

Участники привлекаются только при необходимости — по договору, в пределах лимитов и с понятными правами

ЭТАП 1
Нужны ли реальные пользователи

ЭТАП 2
Возможность привлечения и риски

ЭТАП 3
Нужна ли фокус-группа, какие партнеры

ЭТАП 4
Критерии отбора, договоры, права сторон

ЭТАП 5
Использование продукта под контролем

ЭТАП 6
Обратная связь и показатели группы

ЭТАП 7
Обязательства перед участниками

ЗАЩИТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (ИЗ ОТЧЕТА, ИЛЛ. 14) — В КАЖДОМ ПЛАНЕ ТЕСТИРОВАНИЯ

Информирование

Стандартное уведомление: услуга тестируется в песочнице МЦЦТ в установленных пределах; допуск не означает одобрения и не является лицензией

Жалобы и инциденты

Жалобы — сначала участнику, затем в Секретариат; об инцидентах участник сообщает в течение 2 р. д.; пороги остановки согласуются заранее

Ответственность

Только участник. До теста в реальных условиях — страхование, гарантия или обособленные средства для компенсации в пределах лимитов; фонда за счет МЦЦТ нет

План свертывания

Обслуживание, возврат средств или передача пользователей при досрочной остановке теста или несостоятельности участника; утверждается при проектировании теста

Методология. Критерии отбора и показатели группы фиксируются в плане тестирования — против нерепрезентативности и предвзятости. Отзывы участников: распределение оценок и n; среднее не рассчитывается, если ответов меньше десяти (KPI 12).

Допуск: только тесты с конкретным барьером

Критерии оценивает Секретариат, решает Комитет; пределы каждого теста фиксируются в плане на этапе 4

КРИТЕРИИ ДОПУСКА

Подлинная новизна	Технология или модель, новая для Узбекистана или существенно лучше имеющихся (MAS Plus: заявки на уже применяемые технологии не одобрены)
Необходимость теста	Конкретная регуляторная неопределенность или барьер; иначе — Трек разъяснений (Ofgem: 22 из 30 не указали барьер)
Польза	Обоснованно ожидаемая польза для пользователей, торговли или экономики данных
Готовность	Работающий прототип, система управления, базовая безопасность и ресурсы для теста и выхода
Соответствие приоритетам	В рамках мандата МЦЦТ в области новых технологий
Благонадежность	Проверка личности, бенефициаров и директоров; санкционные списки при заявке, допуске и смене контроля; при подтвержденных сомнениях — отказ

ПРЕДЕЛЫ КАЖДОГО ТЕСТА — В ПЛАНЕ НА ЭТАПЕ 4

- Пользователи
- Операции
- Территория
- Срок
- Данные
- Остановка

НЕ ПОДЛЕЖАТ ОСВОБОЖДЕНИЮ (ПРЕЗУМПЦИЯ)

- Санкционные обязанности
- Противодействие финансовым преступлениям (ПОД/ФТ)
- Базовая защита персональных данных
- Критически важные требования безопасности

ИИ-инструменты комплаенса дополняют, но не заменяют предусмотренные законом меры контроля и решение человека. Переводы денег и ценностей — только через поднадзорную организацию или с письменного согласия органа.

Иллюстрация 14 отчета; [S6] Ofgem; [S7] MAS. Пределы теста — по модели МЦЦТ.

Границы программы и риски

Чего МЦЦТ не делает и не гарантирует — и какие риски контролирует; два риска оценены как высокие

НЕ ДАЕМ И НЕ ГАРАНТИРУЕМ

- **Лицензий и разрешений: их выдают уполномоченные органы**
- **Освобождений от требований закона по умолчанию**
- **Допуска каждому заявителю: отбор, возможен отказ**
- **Любых запрошенных данных и участников**
- **Права работать после теста без отдельного решения**

НЕ ДЕЛАЕМ

- **Не допускаем реальные операции до этапа 4**
- **Не проводим тест без лимитов и сроков**
- **Не заменяем решения других органов**
- **Не открываем данные одной компании другим автоматически**
- **Не снимаем ответственность за вред пользователям**

РИСКИ И КАК ИХ КОНТРОЛИРУЕМ (ОЦЕНКА АНАЛИТИКА)

Высокий	**Правовая основа уже, чем предполагалось**	Правовой спринт; заключение юристов до принятия правил; запасные варианты
Высокий	**Регуляторы не дают согласия**	Согласие не презюмируется; письмо с вариантами; эскалация; KPI 15
Средний	**Низкий или нецелевой спрос**	Интервью по оценке спроса; на старте — два трека
Средний	**Ущерб пользователям или данным**	Лимиты, стоп-лосс, экспертная проверка, уведомление об инцидентах, план свертывания
Средний	**Финансовые преступления и санкции**	Проверка благонадежности; ПОД/ФТ без освобождений
Средний	**Перегрузка персонала**	Первичный разбор с направлением в Трек разъяснений; лимит приема; учет часов
Средний	**Слабый отбор ослабляет сигнал**	Опубликованные критерии и обоснования решений
Средний	**Конфликт продвижения и отбора**	Правила о конфликте интересов; опубликованные критерии
Средний	**Зависимость от одного партнера**	Решения остаются за МЦЦТ; ни одна контрольная точка не зависит от WEF

Границы — по модели МЦЦТ; риски — Иллюстрация 17 отчета: [S2] [S5] [S7] [S15] [S23] [S27] [S32].

Что происходит после теста

Итоговый отчет дает два самостоятельных вывода; успешный тест не дает автоматической лицензии

Итоговый отчет

ДАЛЬНЕЙШИЙ РЕЖИМ ПРОЕКТА	НОРМАТИВНАЯ БАЗА
Положительная оценка Внедрение, продолжение с условиями или расширение в МЦЦТ: решение Управляющего совета (ст. 43*)	**Правила достаточны** Применяется существующий режим; обоснование сохранения правил фиксируется
Нужна лицензия или разрешение Отдельная процедура, если предусмотрена правом; решает уполномоченный орган, а не Комитет	**Нужно изменить правила** Обоснование и проект поправок в пределах полномочий МЦЦТ или предложения компетентному органу
Условия не выполнены Приостановка, завершение или доработка; обязательства перед пользователями сохраняются	**Новые правила вступили в силу** Проверка соответствия, индивидуальный допуск — при необходимости

Успешный тест не дает автоматической лицензии или права продолжать деятельность. Австралия (ASIC): 1 лицензия на 16 выходов, 12 компаний закрылись (S).

ДОБАВЛЯЕМ ИЗ ОТЧЕТА

Отчет о выходе

Комитет фиксирует: что тестировалось, на каких условиях, какие доказательства получены, какой вариант выхода

Отчет о регуляторных выводах

В течение 60 календарных дней после когорты (для когорты 1 — ≈ M14); утверждает Совет

Отслеживание итогов

Финансирование, лицензия, выживаемость — через 12 и 24 месяца после допуска

Пересмотр и апелляция

Отказ, условия, приостановление, прекращение, продление, вариант выхода — коллегия Совета из трех членов

Модель МЦЦТ; раздел 5.5 и Иллюстрация 12 отчета; [S24] ASIC. * Ст. 43 — по материалам МЦЦТ.

Первый портфель: три пилота и один внутренний

Отобраны из десяти идей по пяти критериям; у каждого — ответственный, орган согласия и запасной вариант

P1 Доверие к ИИ-агентам, совершающим транзакции

БАРЬЕР

Нет позиции об отнесении действий ИИ-агента к принципалу

ТЕСТ

Синтетические данные — M6–M8; реальные условия — M8–M12

ПЕРВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Итоги «красной команды» и журналирования атрибуции (M8)

СОГЛАСИЕ

Для этапа в реальных условиях — если этого потребуют юристы

ЗАПАСНОЙ ВАРИАНТ

Только этап на синтетических данных; разъяснения, а не правило

P2 Электронные торговые документы с проверкой на основе ИИ

БАРЬЕР

Признание электронных передаваемых записей (MLETR) не установлено

ТЕСТ

Этап A — M3–M6; B — M6–M12; C — M8–M12 при успехе A

ПЕРВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Доля ошибок проверки ИИ в сравнении с ручной (этап B)

СОГЛАСИЕ

Ведущий орган, в процедуре которого принимается документ

ЗАПАСНОЙ ВАРИАНТ

Только проверка ИИ (этап B) и записка о правовом пробеле

P3 Обмен данными с сохранением конфиденциальности

БАРЬЕР

Вторичное использование и передача данных; нет критериев обезличивания

ТЕСТ

Проектирование — M3–M6; тест — M6–M12

ПЕРВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Тест на повторную идентификацию; полезность против базового значения

СОГЛАСИЕ

Национальный орган по защите персональных данных

ЗАПАСНОЙ ВАРИАНТ

Только синтетические данные

P4 Проверка отчетности с помощью ИИ — внутренний пилот

БАРЬЕР

Внутренний: правила МЦЦТ об автоматизированных проверках

ТЕСТ

Проектирование — M3–M5; тест — M6–M11

ПЕРВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Время проверки отчета; доля ложных срабатываний и пропусков

СОГЛАСИЕ

Не требуется: внутренний пилот без допуска Комитетом

ЗАПАСНОЙ ВАРИАНТ

Тест на документах о регистрации участников

Контрольная точка M6. Самый ранний результат, вероятно, даст P4 — если обязанность отчетности вступит в силу к M5; у P2 — наибольший риск задержки (A).

WEF: организатор диалога, а не владелец модели

Опыт WEF как организатора диалога задокументирован; опыт проектирования песочниц или управления ими — нет

ЧТО WEF УЖЕ СДЕЛАЛ

- **TradeTech (ОАЭ):** MoU — янв. 2024, доклад — окт. 2025; 8 стартапов (P)
- **GRIP:** партнерство с ОАЭ (янв. 2025, запуск — июль 2025); три результата запланированы (T), опубликованных на окт. 2026 г. не найдено
- **Дроны:** регулирование в Руанде (с 2017 г.), инструментарий для Индии (2019 г.) (P)
- Регулятором или лицензирующим органом WEF не является

ЧТО ЗАПРОСИТЬ: РЕЗУЛЬТАТЫ W1–W5

W1	Экспертная рецензия проекта Правил — не менее двух опытных операторов песочниц; День 75 — M4
W2	Круглый стол с регуляторами минимум двух юрисдикций — M4–M6
W3	Рецензия проекта пилота P2 — факультативно, вне критического пути (M3–M5)
W4	Итоги TradeTech по каждому участнику — до W3
W5	Доступ к материалам GRIP — по мере публикации

УСЛОВИЯ ПРИВЛЕЧЕНИЯ (D8)

1. Решения, правила, риски и отношения с регуляторами — за МЦЦТ; у WEF нет голоса и вето
2. Данные участников не передаются без их согласия и одобрения МЦЦТ
3. МЦЦТ рассматривает публикации WEF до выхода; итоги — по каждому участнику
4. Неэксклюзивность: МЦЦТ работает с регуляторами и организациями напрямую
5. Поставщики, представленные WEF, — в открытом тендере на общих основаниях
6. Оплата — за принятые результаты; модель оплаты — письменно

Ни одна контрольная точка МЦЦТ не зависит от WEF: если рецензия W3 не поступит к M5, пилот P2 продолжится без нее.

Первые 90 дней: критический путь к запуску

День 0 — принятие отчета Советом; День запуска (цель — День 90) — открытие Трека разъяснений

Дни 20–25

№1 · критический
Изучить официальные тексты и положения о песочнице

№2 · критический
Заключение о полномочиях; ответ на правовой вопрос по каждому пилоту

День 30

№3 · критический
Совет утверждает операционную модель, треки и полномочия по допуску (D1, D2)

День 45

№5 · высокий
Руководитель песочницы и основная команда (~6 человек)

№10 · высокий
Проверка спроса: интервью с потенциальными участниками

День 60

№6 · критический
Комитет: положение, члены, пул экспертов, конфликт интересов

№7 · высокий
Органы по пилотам; протокол согласования и правила перенаправления

№9 · высокий
Состав MVP платформы и способ закупки

День 75

№4 · критический
Проект Правил песочницы

№11 · высокий
Выбор пилотов P1–P3 и внутреннего P4

№12 · средний
Рамки поддержки WEF и других партнеров

День 90 · запуск

№8 · высокий
Открыть Трек разъяснений

№13 · средний
Словарь KPI и типовое соглашение о тестировании


№14 · высокий
Положение о рисках, кибербезопасности и комплаенсе

№15 · средний
Проспект песочницы и объявление набора в когорту 1

Раздел 8.1 и Иллюстрация 22 отчета. Критические меры выделены; номера — меры плана на 90 дней.

12 месяцев: четыре фазы и контрольные точки

Каждая фаза завершается решением; первые допуски — в 6-м месяце, ежегодный обзор Совета — в 12-м

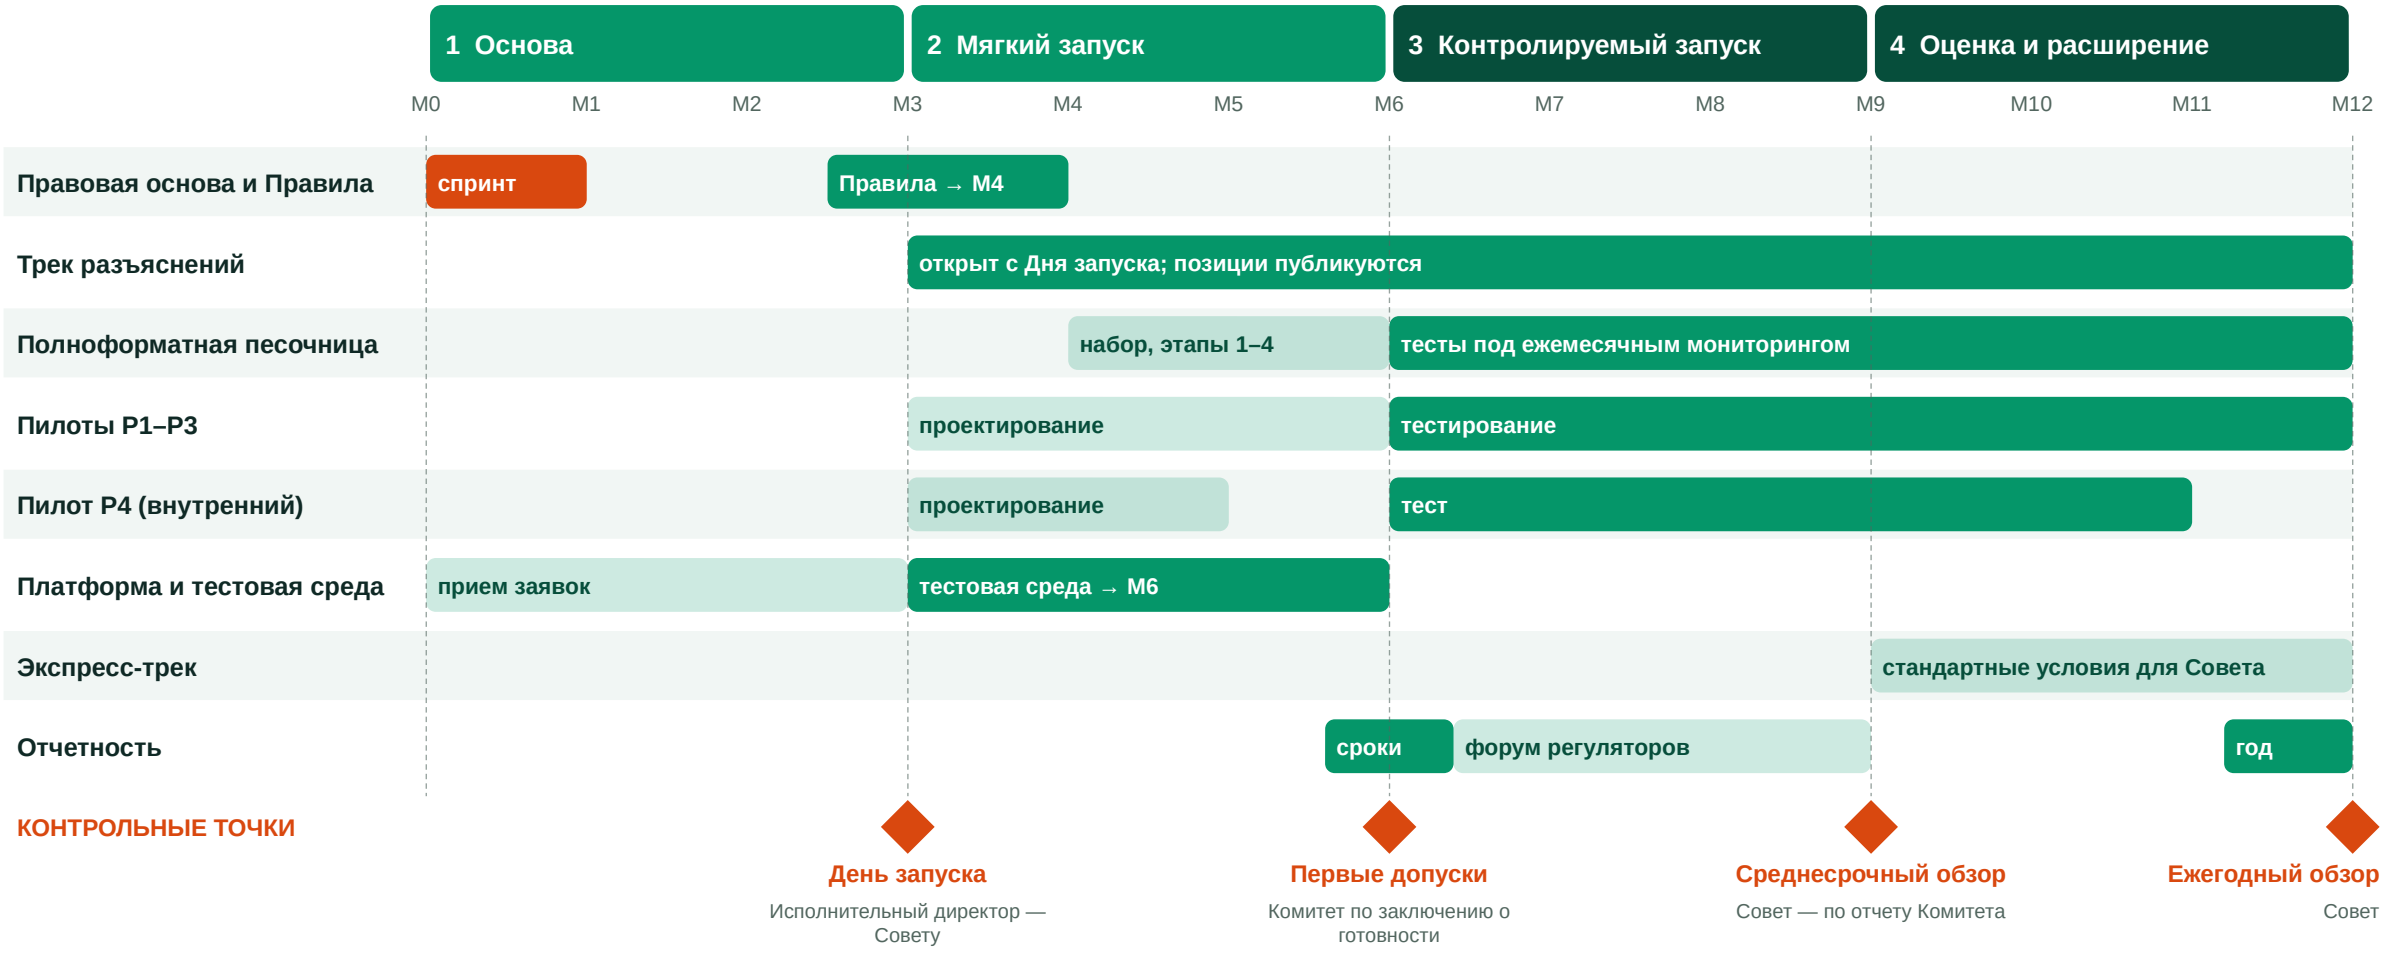

KPI: 15 показателей; 1-й год — по выполнению плана

Базовых значений у МЦЦТ пока нет: числовые цели — плановые допущения; данные об итогах — примерно с 14-го месяца

1	**Срок решения (полноформатная песочница)** медиана р. д.; норматив — 50 р. д.	M6	2	**Срок предварительной проверки** доля в нормативе 10 р. д.	Запуск	3	**Своевременность разъяснений** цель — после первых 20 дел	≈ M5
4	**Запущенные пилоты** плановый диапазон — 3–4 в 1-й год	M6	5	**Тесты, завершенные с доказательной базой** цель — все тесты, включая остановленные	≈ M14	6	**Переход на постоянный режим** в течение 12 мес. после выхода	≈ M26
7	**Устраненные регуляторные неопределенности** цель — после первых 20	≈ M5	8	**Записки о выводах для регулирования** все тесты; 60 календарных дней	≈ M16	9	**Частные инвестиции** только отчетность, без цели	≈ M30
10	**Охват иностранных компаний** цель — после проверки спроса	≈ M5	11	**Трансграничные эксперименты** в 1-й год не ожидаются	2-й год	12	**Отзывы участников** распределение и n; динамика по когортам	≈ M14
13	**Экономия затрат и времени** оценка участника; без экстраполяции	≈ M14	14	**Инциденты с ущербом** порог — в системе управления рисками	M6	15	**Срок согласий регуляторов** медиана по каждому органу; срок — в MoU	≈ M5

Скорость · Пропускная способность · Итоги · Регуляторный эффект · Безопасность и качество

Справа — месяц первых данных

Раздел 8.4 и Иллюстрация 24 отчета. MAS: 15 из 19 — только для справки, не цель.

Матрица решений D1–D12

Правовая верификация — к Дню 20; затем операционная модель и полномочия по допуску — к Дню 30

#	Решение	Рекомендуемый вариант	Кто решает	Срок
D1	**Операционная модель и очередность треков**	Два трека при запуске: разъяснения — в День запуска, набор в полноформатную песочницу — M4; Экспресс и прототипирование — после когорты 1 (≈ M13–M14); трансграничный — 2-й год	Управляющий совет	**День 30**
D2	**Полномочия по допуску**	Делегировать Комитету, если подтвердят юристы; иначе — решения Совета в заочном порядке; порядок работы Комитета, включая срочное приостановление	Управляющий совет	**День 30**
D3	**Секретариат, штат и бюджет**	~6 человек во главе с руководителем песочницы (плановое допущение); смета к Дню 45; без платы в 1-й год; два транша финансирования	Совет — смета; Исп. директор — назначения	**День 45**
D4a	**Правовая верификация**	Юристы изучают официальные тексты до разработки любых правил	Главный юрисконсульт по поручению Председателя	**День 20 / 25**
D4b	**Правила песочницы**	Проект для консультаций — День 75; окончательные Правила — M4	Управляющий совет	**День 75 / M4**
D5	**Меры защиты, ответственность, комплаенс**	Лимиты, информирование, стоп-лосс и инциденты в каждом тесте; ответственность участника; проверка благонадежности	Управляющий совет	**День 60**
D6	**Портфель пилотов**	Критерии — сейчас; P1–P3 и P4 — День 75; допуск — Комитетом после принятия Правил	Совет — портфель; Комитет — допуск	**День 75**
D7	**Цифровая платформа**	MVP; открытый тендер; сначала синтетические данные; временная система ведения дел к запуску	Исполнительный директор	**День 60**
D8	**Международные партнеры**	WEF — организация диалога (W1); прямые MoU с регуляторами; условия W1–W5 и 1–6	Совет; подписывает Председатель	**День 75**
D9	**Политика публикации**	Сроки и их соблюдение, обезличенный реестр дел, отчеты о выходе и выводах	Управляющий совет	**День 60**
D10	**Система KPI**	Карта из 15 показателей; базовые значения — после когорты 1	Исполнительный директор	**День 75**
D11	**Английская редакция отчета**	Выпуск после шагов 1–3 плана верификации	Председатель	**Дата — на заседании**
D12	**Согласие регуляторов и перенаправление**	Согласие не презюмируется; один допуск на вид деятельности; правила перенаправления с ЦБ и NAPP	Управляющий совет	**День 60**

■ — вносится на данном заседании

Статус данных и что согласовать с моделью МЦЦТ

Отчет — проект для принятия решения: до внешнего цитирования цифр нужен верификационный спринт

МЕТКИ ТИПА ПОДТВЕРЖДЕНИЯ

- **R** Результат, о котором сообщил регулятор или правительство
- **I** Независимая оценка (наибольший вес)
- **P** По данным участника, поставщика или организатора
- **S** Только вторичный источник (СМИ, обзоры)
- **T** Цель или намерение, а не результат
- **D** Расчет на основе заявленных данных
- **A** Интерпретация или рекомендация аналитика
- **W** Рабочие материалы МЦЦТ (проект, не проверено)

СТАТУС ПРОВЕРКИ

- Исследование источников проведено 20 октября 2026 г.
- Большинство сайтов первоисточников не открылись напрямую: цифры взяты из пересказов в поисковой выдаче или вторичных источников
- **Ни одна цифра не сверена с полным текстом первоисточника** (Приложение D, шаг 2)
- Официальные тексты УП-233 и ЗРУ-1169 еще не изучены (шаг 1)
- Плановые допущения — сроки, штат, цели — не являются базовыми значениями МЦЦТ

ЧТО СОГЛАСОВАТЬ С МОДЕЛЬЮ МЦЦТ

1. **Этапы:** девять этапов отчета сведены к семи этапам МЦЦТ; сроки сохранены. Трек разъяснений — дополнение отчета
2. **Допуск:** в модели МЦЦТ — Администрация; в отчете — Комитет по делегированию Совета. Предлагаем Комитет при Администрации
3. **Ст. 39–43, 41, 43** — по материалам МЦЦТ; с текстом закона не сверены
4. **AFSA** в отчете — лишь кратко (илл. 20, прил. A); **ЦБ Ирландии** нет
5. **IT Park** — предлагаемая возможность, а не заключенное соглашение
6. **Название:** МЦЦТ в презентации и EUz (Enterprise Uzbekistan) в отчете — одна организация
